

Fiche d'Identification de projet relatif au Lot 1
Le Plan d'Investissement du Focal Fonds bleu pour le Bassin du Congo F2BC

Etude de Préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo
Appel d'Offre: GP600656

Personne de contact au niveau pays

- 1. Godefroid NDAUKILA MUHINYA**
Directeur de la Direction de Développement Durable
- 2. Aimé Mbuyi Kalombo**
Chef de Division Changement Climatique
- 3. Arsène BYAENE TUBONGYE**
Point Focal Fonds bleu pour le Bassin du Congo



I. Introduction de la Fiche d'Identification Projet

Objectif de la Fiche d'Identification Projet

- Dans le cadre de l'étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, cette Fiche d'Identification Projet (FIP) se présente comme le document que tout Porteur de Projet (PP) - désireux de demander un financement auprès du Fonds Bleu - se doit de remplir.
- Le Consortium EY évaluera la maturité de chaque projet par le biais de l'examen de la présente fiche (c.-à-d. la FIP). Ainsi, l'exhaustivité et la clarté de la Fiche d'Identification Projet sont essentielles à la bonne analyse du Consortium EY.
- Cette FIP vise à collecter les principales informations relatives au projet qui permettront au Consortium EY de structurer et de promouvoir un pipeline de projets qui sous-tendra le futur Fonds Bleu.

II. Informations Générales

Identification du projet (1/2)

Identification du projet	
Nom du projet	Nom du projet: " PROJET D'AMELIORATION DES CONDITIONS D'ACCES A L'EAU POTABLE ET A L'ASSAINISSEMENT DES VILLAGES DANS LE SECTEUR DE GOMBE MATADI" Portée géographique du projet: ☒ National ☐ Multi pays Dans le cas d'un projet multi-pays, indiquer le nom des pays participant au projet:
Typologie de projet	☒ Adaptation ☐ Atténuation ☐ Compensation carbone
Programme sectoriel dans lequel s'inscrit le projet (1/2)	Parmi les 24 programmes de l'économie bleue, sélectionnés par les Ministres de l'environnement de la CCBC dans quel programme s'inscrit votre projet? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


	19. 20. 21. 22. 23. 24.
Localisation du projet	SECTEUR DE GOMBE MATADI TERRITOIRE DE MBANZA NGUNGU DISTRICT DES CATARACTES PROVINCE DU KONGO –CENTRAL REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Pr. Bas-Congo

District Cataractes

Territoire de Mbanza-Ngungu

25

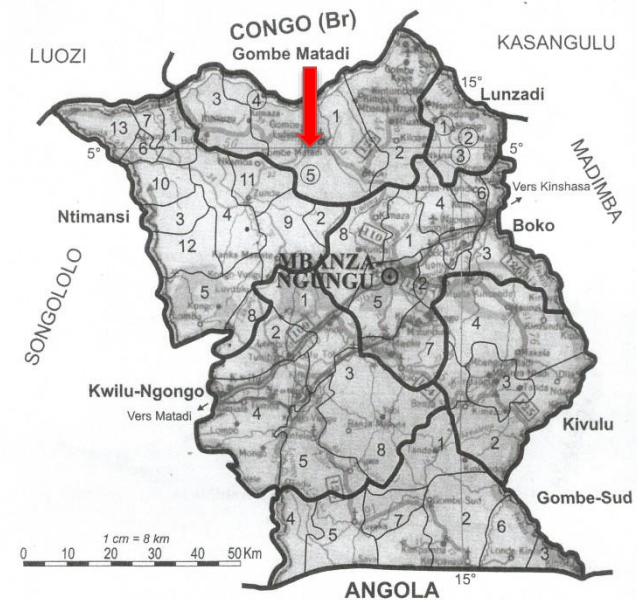

Secteur BOKO	Secteur GOMBE-MATADI	Secteur GOMBE-SUD	Secteur KIVULU	Secteur NTIMANSI
1 KIAZI	1 GOMBE-MATADI	1 BANGU	1 KOLOTAVA	1 FUMFU
2 KIFUA	2 KILOANGO	2 GOMBE-SUD	2 MBANZA-NSUNDI (Ngungu)	2 KILUA
3 KINDUNDU	3 KINKUZU	3 KILOANGO	3 MBANZA-NTADI	3 KIMOKO
4 LOVO	4 KINZINGA	4 KINSENDE	4 NDEMBO-MBONGO	4 KONGO-BOTONGO
5 LUVAKA	5 NKANDU-KIAMA	5 LUNAKA		5 LOMBO-FUESE
6 MBANZA-NSUNDI		6 MBANZA-MBATA		6 LUKUNGA
7 NKOLO		7 MONGO		7 NDUNGA
8 TADILA		8 NKYENDE		8 NKANDANDA
				9 NIONGA
				10 NTADI
				11 NZUNDU
				12 SANGA
				13 SANZALA

© Cepas - BP 5717 Kinshasa

(CARTE DU TERRITOIRE DE MBANZA NGUNGU)

Durée du projet : 5 ans	Date de début du projet: JANVIER 2021	Date de fin du projet: DECEMBRE 2025
	Si le projet est subdivisé en plusieurs phases, prière de fournir pour chacune d'elles les dates de début et de fin: (LE CHRONOGRAMME VA SUIVRE EN ANNEXE)	

II. Informations Générales

Identification du porteur de projet

Porteur de projet		
Nom et nature du porteur de projet (Entité Juridique)	1. Entité(s) légale(s) portant le projet? ONGD LA PROMESSE " L. P " 2. Dans l'hypothèse d'un projet multi-pays, quels sont les entités légales impliquées?..... Quelle (e) est (sont) la nature du (des) porteur(s) de projet? ☐ Public ☐ Privé ☒ ONG	
Point de contact du projet	Nom (Mr/Ms) : DIAMFIMPA MANTONDILA Prénom : Faustin Responsabilité : COORDONNATEUR ADJOINT	E-mail : faustindiamf@gmail.com Mobile : +243 890178177 / 00243 852260887
Partenaire 1 du projet (si applicable)	Nom du partenaire : FONDS BLEU POUR LE BASSIN DU CONGO Adresse du partenaire : Congo- Kinshasa Nom & Prénom du point de contact (Mr/Ms) : Arsène BYAENE TUBONGYE	Position du point de contact : Point Focal Fonds bleu pour le Bassin du Congo en RD Congo E-mail du point de contact : bilende01@gmail.com Mobile du point de contact : 00243 81 2981459/ 00243 85 480 1614

Partenaire 2 du projet (si applicable)	Nom du partenaire : Adresse du partenaire : Nom & Prénom du point de contact (Mr/Ms) :	Position du point de contact : E-mail du point de contact : Mobile du point de contact :
Partenaire 3 du projet (si applicable)	Nom du partenaire : Adresse du partenaire : Nom & Prénom du point de contact (Mr/Ms) :	Position du point de contact : E-mail du point de contact : Mobile du point de contact :

II. Informations Générales

Contenu du projet (1/3)

Contenu du projet

A) Description du projet ?

En quoi consiste le projet proposé ? Le Porteur de Projet doit fournir une description claire et précise du projet (900 caractères – avec espace – maximum).

Ce projet consiste à accompagner 1500 ménages vivant dans les localités du secteur de GOMBE MATADI en vue d'améliorer leur bien être par l'accès durable à l'eau potable au moyen de l'aménagement de 60 sources d'eau, la construction de 30 puisards d'eau, procéder au forage de 15 puits pour le stockage de l'eau potable dans les milieux où les sources sont introuvables, et l'assainissement de leur milieu de vie par la construction de 30 latrines publiques et le placement de 200 dispositifs pour lavage des mains, l'installation de 100 dispositifs avec panneau solaire dans les villages, la construction de 4 Ecoles et 4 Centres de Santé, ainsi que la réhabilitation de 100 kilomètres de route en terre pour le désenclavement du milieu.

Il y a 90% de la population très pauvre dans ce Secteur qui s'approvisionnent encore dans des rivières ou des marigots avec toutes les conséquences néfastes quant à l'hygiène et à la santé.

B) Enjeux du projet ?

En quoi le projet servira-t-il à l'un ou plusieurs des quatre enjeux du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo (900 caractères – avec espace – maximum).:

- Enjeux 1 : Développer une activité économique durable supportant la transition économique du Bassin du Congo
- Enjeux 2 : Contribuer à la mise en œuvre des engagements du Bassin du Congo dans le cadre de l'Accord de Paris (Mise en œuvre des CDN)
- Enjeux 3 : Structurer la transition climatique du Bassin du Congo autour des 24 programmes sectoriels
- Enjeux 4 : Contribuer à l'intégration de la sous-région

Le présent projet à caractère d'adaptation touchera plusieurs domaines de la vie paysanne qui répondent aux objectifs du Fonds Bleu du Bassin du Congo. Pour ce faire, plusieurs activités prévues dans ce projet vont générer une économie durable dans le secteur de GOMBE MATADI par la création de l'emploi permanent en faveur de la population active en tenant compte de la femme et des personnes vivants avec handicaps. Parmi les activités génératrices de revenu, nous citons : la distribution de l'eau des puits de forage à moindre coût, l'instauration de péage dans les routes réhabilitées en vue de leur maintenance. Les Ecoles et Centres de Santé construits seront producteurs de revenus. Nous préconisons aussi sensibiliser et initier la population sur la pratique d'autres activités rentables en occurrence : la pisciculture, l'aquaculture, l'apiculture dans le but d'aider les paysans de faire une transition de l'économie vert (forêt) vers l'économie bleu (eau).

II. Informations Générales

Contenu du projet (2/3)

C) Objectifs du projet?

Quels sont les objectifs stratégiques du projet?

Quels sont les objectifs opérationnels du projet?

- Merci de bien vouloir déterminer d'un point de vue qualitatif et quantitatif, les objectifs attendus

(900 caractères – avec espace – maximum).

1. Objectifs stratégiques.

- Sensibiliser la population à changer de mentalité vis-à-vis de l'accès à l'eau potable et aux pratiques d'hygiènes ;
- Renforcer les capacités des populations concernant l'eau potable ;
- Exécuter les travaux d'aménagement des sources d'eau, forage des puits d'eau et construction des puisards ;
- Construire les écoles, centre de santé et latrines publiques ;
- Réhabiliter les routes de desserte agricole
- Mettre en place des comités locaux d'eau, d'hygiène et d'assainissement
- Intégrer la femme et les personnes vivants avec handicap dans la mise en œuvre du projet ;
- Identifier et cartographier les sources d'eau potable de surface et souterraine.

2. Objectifs opérationnels

- 1500 ménages sont desservis en eau potable de façon durable ;
- 60 sources d'eau sont aménagées
- 15 forages et 30 puisards sont installés
- 30 latrines, 4 écoles et 4 centres de santé sont construites
- 100 foyers sont éclairés avec panneau solaire
- 100 km de route en terre sont réhabilités avec la méthode HIMO
- 200 dispositifs pour lavage des mains sont placés,

II. Informations Générales

Contenu du projet (3/3)

E) Impacts du projet?

Quels sont les impacts attendus (quantitatifs et qualitatifs) du projet sur les principaux objectifs de la CCBC et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo?

1) Impacts généraux

- Impact sur la CDN
- Impact sur les ODD
- Impact sur l'intégration de la sous-région

2) Impacts spécifiques

- Impact Environnemental notamment en matière d'Adaptation
- Impact social (inclusion, genre, renforcement de capacités...)
- Impact économique (emploi, croissance, leadership industriel africain...) et cohérence avec les stratégies macro-micro économiques nationale

(1700 caractères – avec espace – maximum).

1. Impacts généraux.

Le projet que voici aura des impacts généraux répondants aux exigences de la Contribution Déterminée au niveau Nationale (CDN) et les Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi qu'à l'intégration de la sous-région par :

- L'instauration de la consommation responsable
- La promotion de l'innovation et des infrastructures durable ;
- La lutte contre le changement climatique ;
- La protection de la faune et flores aquatique ;
- La protection de la faune et flore terrestre ;
- La réduction des inégalités.

2. Impacts spécifiques

Un grand nombre d'impacts seront visibles au moment où la mise en œuvre de ce projet sera en pleine finalisation, notamment :

- L'éradication de la pauvreté ;
- La lutte contre la faim
- L'accès à la santé
- L'accès à une éducation de qualité
- L'égalité entre les hommes et les femmes
- L'accès à l'eau salubre et l'assainissement
- L'accès aux énergies renouvelables
- L'accès à des emplois décents
- La création de villes et de communautés durables

ANALYSE DU PROJET

1. Aspect Economique

Le secteur de Gombe Matadi avec une superficie de 1.875Km² est l'un des secteurs du territoire de Mbanza-Ngungu situé à 5° 02' S et 14° 51' E dans la Province du Kongo Central. Ce secteur très enclavé et démunie suite à la dégradation des routes de desserte agricole et les infrastructures sociales de base est caractérisé par une population très pauvre.

Cette population de 42.891 habitants vit dans un environnement très insalubre dont la seule activité est l'agriculture manuelle. Le changement climatique a causé beaucoup des dégâts dans ce secteur notamment la pollution des eaux ayant pour conséquences ; la persistance des maladies d'origine hydrique telles que le choléra, la diarrhée, la typhoïde, etc. C'est dans cette zone de santé qu'on a eu déjà à enregistrer 149 cas de choléra dont 15 décès suivant le rapport de l'ACP du Ministre Provincial de la Santé du Kongo Central datant de 2016.

Les besoins en adaptation sont très énormes dans ce secteur, cela nécessite un travail fouillé qui aura pour impact ; l'amélioration du bien-être de la population par l'aménagement des sources d'eau, par le forage des puits d'eau et l'assainissement de leur milieu de vie.

La sensibilisation paysanne les aidera à adopter un comportement responsable et positif concernant les règles d'hygiène et la prise de l'eau potable en vue d'éviter certaines maladies.


Bien que la République Démocratique du Congo soit le pays d'Afrique possédant les ressources hydrologiques les plus importantes, elle fait aujourd'hui face à une crise croissante de l'approvisionnement en eau potable dans le milieu rural comme dans le milieu urbain. Seul 26% de la population congolaise ont accès à l'eau potable, en raison des infrastructures soient inexistantes, soient endommagées et fragilisées par des années de sous-investissement, des conflits et de croissance rapide de la population. Ainsi, le taux de couverture de l'approvisionnement en eau potable a fortement décliné. Malgré la complexité de la situation du pays post-conflit, la volonté politique et l'aide internationale ont généré actuellement une dynamique positive pour le secteur de l'eau en République Démocratique du Congo.

Ce projet vise à accompagner 1.500 ménages disséminés dans quelques localités du secteur de Gombe Matadi en vue de l'amélioration de leur bien être par l'accès durable à l'eau potable au moyen de l'aménagement des sources d'eau existantes, procéder au forage des puits pour le stockage de l'eau potable dans les milieux où les sources sont introuvables, et l'assainissement de leur milieu naturel par la construction des latrines publiques et le placement des dispositifs de lavage des mains dans les milieux publics en vue des meilleurs conditions d'hygiènes.

On estime environs 10% de la population du secteur de Gombe Matadi qui a accès à l'eau potable avec des sources aménagées, tandis que 90% de la population très pauvre à difficilement accès à l'eau potable malgré la disponibilité des sources aménageables dans certains milieux.

Dans la plupart des cas, ces populations s'approvisionnent encore dans des marigots ou des rivières avec toutes les conséquences néfastes quant à l'hygiène et à la santé. Certains ménages sont obligés de parcourir des longues distances pour accéder à l'eau, ce qui constitue un danger permanent surtout pour les femmes et jeunes les filles face au phénomène violence sexuelle et désertion scolaire. Il s'avère que pendant la saison pluvieuse beaucoup de ses sources et rivières sont perturbées et polluées tandis que pendant la saison sèche ces sources et rivières ont tendance à sécher. Ce qui prive les populations d'accéder à l'eau potable et constitue un frein au développement socio-économique dans ce milieu.

Budget du projet	(en USD) 3.720.000	
Génération de revenus	Est-ce que le projet génère des revenus? OUI	
Estimation des revenus	Sur combien d'années, avez-vous estimé les revenus? : 3 ans (conformément à la durée du projet) Total des revenus sur cette période: _____82.125_____ (en USD) Vente de l'eau dans les puits de forage au bénéficiaires afin d'assurer la pérennité du projet	
Estimation des coûts fixes (achat de matériel, location, les salaires etc.)	Coût Fixe (en USD)	Achat de matériel : 229.800 Location du terrain : 135.000 Salaires : 306.000 Honoraires de conseillers (avocat, expert comptable...) : 45.500 Coûts d'amortissements : 114.900 Autres: 12.585
	Coût Variable (en USD)	Achat de matières premières : 198.200 Taxe: 52.725 Gaz, Essence, Eau : 26.000 Autres : 2.599.290



1. ASPECT JURIDIQUE

Ce projet à caractère public et privé sera accompagné par un cabinet juridique qualifié afin de bien comprendre l'ensemble des éléments de droit qui vont venir impacter directement ou indirectement les activités du projet. Nous serons tenus au respect de la législation fiscale, les textes légaux et les taxes en vigueur dans notre pays. Ainsi, ce projet contribuera au relèvement Socio-économique du secteur de GOMBE-Matadi en particulier, et de la République Démocratique du Congo en général. Nous veillerons à ce que notre structure soit en ordre par rapport à la légalité et à la légitimité.

Porteur de projet	Conformité légale, fiscale et administrative du porteur de projet	Est-ce que le porteur de projet est conforme avec les aspects légaux, fiscaux et administratifs? ☒ Oui* ☐ Non
	Contrats clients	Est-ce que le porteur de projet possède des contrats commerciaux liés à son projet? ☐ ☒ Non Pour quel montant en USD?
Projet	Autorisations et permis	Est-ce que le projet possède l'ensemble des autorisations et des permis (constructions, inscription seront auprès du greffe etc....) afin de commencer le projet? ☐ Oui* ☒ Non Les démarches pour leur obtention sont en cours.
	Autorisations environnementales	Est-ce que le projet possède les autorisations/certifications environnementales ? ☐ Oui* ☒ Non Les justificatifs, les contrats et autres documents seront délivrés après acceptation du Projet. Les Acteurs étatiques et Non étatiques craignent de s'engager pour rien tellement que le régime politique passé a fait fuir les investisseurs et les partenaires de développement.

*Prière de fournir tous les justificatifs

3. ASPECT OPERATIONNEL

L'aspect opérationnel consiste à tracer le cheminement des étapes à suivre dans la réalisation proprement dite de ce projet notamment :

1) Les études de faisabilité.

C'est une étude qui doit être menée à priori pour nous rassurer quant à la réalisation possible du dit projet. Ces études seront menées par le concours d'un cabinet des experts qualifiés en la matière.

2) L'impact environnemental et social

Il consiste à faire l'évaluation de l'impact environnemental qui doit être notre let motive afin d'être fixé si ce projet ne vient pas contribuer à la destruction de l'environnement que nous sommes censés préserver, et aussi nous rassurer si ce projet favorise l'amélioration réelle des conditions de vie des populations bénéficiaires étant un projet d'adaptation. Pour ce faire, nous allons contracter avec un cabinet d'experts qualifiés en la matière pour réaliser cette évaluation.

3) Objectifs.

3.1. Objectif global.

L'objectif global est celui de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires par le renforcement du pouvoir d'accès durable à l'eau potable avec des meilleures conditions d'hygiènes et à l'assainissement de leur milieu de vie.

3.2. Objectifs spécifiques.

Objectifs spécifiques	Résultats attendus.
- Sensibiliser la population à changer de mentalité vis-à-vis de l'accès durable à l'eau potable ; - Renforcer les capacités des populations concernant l'eau potable en vue de favoriser un développement socio-économique ; - Exécuter les travaux d'aménagement des sources d'eau et de forage des puits d'eau ; - Construire les écoles, les centres de santé et latrines publiques ; - Réhabiliter les routes de desserte agricole et les ouvrages d'arts ; - Sensibiliser et former les populations bénéficiaires sur les pratiques d'hygiènes et d'assainissement ; - Mettre en place des comités locaux d'eau, d'hygiène et d'assainissement ; - Intégrer la femme et la personne vivant avec handicap dans la mise en œuvre du projet.	- 1.500 ménages sont desservis en eau potable de façon durable ; - 60 sources sont aménagées ; - 15 forages sont exécutés ; - 30 latrines publiques sont construites ; - 4 écoles et 4 centres de santé sont construits ; - 100 foyers sont éclairés avec panneau solaire ; - 100 Km de route en terre sont réhabilités (HIMO) ; - 200 dispositifs de lavage à mains sont placés ;

4) COMPOSANTES DU PROJET

N°	Composantes	Activités
01.	Sensibilisation	- Sensibilisation de la population par la radio communautaire ; - Sensibilisation par les ateliers de formation ; - Sensibilisation par les conférences et forums citoyens ; - Sensibilisation en milieu scolaire, universitaires, marché et milieux religieux ; - Sensibilisation par les banderoles, affiches, bandes dessinées, panneaux métalliques ; - Sensibilisation par les théâtres, musique, activités sportives et films.
02.	Production d'eau, Energie Et Assainissement	- Aménagement des sources d'eau existantes, - Disposer des unités des forages d'eau et des puisards ; - Placer des dispositifs de lavage des mains dans les milieux public ; - Placer des dispositifs de panneaux solaires.
03.	Aménagement du Territoire et Infrastructures Sociaux de Bases	- Construction des écoles, centres de santé ; - Construction des latrines publiques ; - Réhabilitation des routes en terre par la méthode HIMO ;
04.	Administration, Etudes et Recherches	- Mener des études de faisabilités du projet ; - Evaluer l'impact environnemental et social du projet ; - Mener de plaidoyer auprès des Autorités- Politico-Administratives et Coutumières sur l'importance du projet ; - Former les personnels affecter à la réalisation du projet ; - Gérer les ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition du projet, - Maintenir le contact permanent avec les Autorités- Politico-Administratives, Coutumières et les partenaires financiers,
05.	Genre, Sécurité Sociale et Problèmes Juridiques	- Intégrer la femme et la personne vivant avec handicap dans la mise en œuvre du projet ; - Création des mutuelles de santé, - Création des micro-crédits des femmes ; - Gestion des conflits sociaux et des problèmes juridiques.

5) FINANCEMENT PAR COMPOSANTE

C'est le décaissement et l'affectation des fonds pour la réalisation effective des activités conformément au budget du projet.

6) CHRONOGRAMME D'ACTIVITES

Dans cette étape, nous allons définir la durée d'exécution de chaque activité tout en tenant compte de l'enchaînement logique de ces dernières et leur priorité jusqu'à la phase finale du projet qui est de 5 ans. Ainsi un chronogramme sera tracé dans un diagramme de GANT pour une bonne précision.

(Le diagramme à faire suivre en annexes)

7) OUTILS DE GESTION

C'est la mise en place des principaux logiciels de gestion du projet et certains documents de bases tel que :

- Manuel de procédure administrative ;
- Le model financier ;
- Budget détaillé ;
- Divers contrats.

8) REALISATION PROPREMENT DITES DU PROJET.

Nous allons mettre en œuvre effectivement le projet, c'est-à-dire réaliser les activités une par une. Cela demande une bonne coordination des parties prenantes, la production des livrables, et la mise à jour des indicateurs clés de performance.

La réalisation du projet requiert beaucoup d'adaptabilité de la part de l'équipe du projet et du responsable du projet tout en tenant compte des imprévus éventuels. La gestion du projet débouchera sur la production des livrables assignés.

9) SUIVI-EVALUATION

Cette étape qui est la dernière, nous permettra de dresser un bilan des activités réalisées tout en en s'assurant si:

- L'objectif global est-il atteint ?
- La problématique soulevée est-elle résolue ?
- Le budget a-t-il été respecté ?
- Les risques ont-ils été bien gérés ?
- Les ressources ont-ils été bien utilisées ?
- Les bénéficiaires sont-ils satisfaits ?

Plan d'actions	Capacité Techniques pour exécuter le projet : Est-ce qu'un organigramme détaillé a été établi avec les CVs appropriés ? ☒ Oui* ☐ Non Est-ce que les études techniques préalables de faisabilité ont été réalisées? Seule une étude de préfaisabilité a été réalisée, sur base des données recueillies dans les institutions publiques, mais qui doivent être confirmées et précisées par une étude de faisabilité. ☐ Oui* ☒ Non Est-ce qu'un planning d'exécution a été bien défini? ☒ Oui* ☐ Non Est-ce que le porteur de projet a défini de manière claire l'impact sociétal et environnemental du projet? ☐ Oui* ☒ Non		
Maturité de la chaine de valeur	Est-ce que le porteur de projet a défini de manière claire sa chaine logistique? ☒ Oui* ☐ Non	Est-ce que le porteur de projet a défini de manière claire sa chaine de production? ☒ Oui* ☐ Non	Est-ce que le porteur de projet a défini de manière claire son service client? ☒ Oui* ☐ Non

*Prière de fournir l'ensemble des justificatifs

4. Financement du Projet

Le financement du projet se fera suivant le budget tel que décrit dans le tableau ci-dessous en fonction des composantes : (le budget suivra en annexe)

N°	Composantes	Coûts USD	Instrument financière
01.	Sensibilisation	138.385	Subvention
02.	Production d'eau et Energie	1.252.200	Subvention
03.	Aménagement du territoire et infrastructures de base	1.156.660	Subvention
04.	Administration-Etudes-Recherches	1.097.690	Subvention
05.	Genre-Sécurité-Problèmes juridiques	75.065	Subvention
TOTAL GENERAL		3.720.000	Subvention

Total investissement	En USD: 3.720.000
Modèle de financement	Quel est le montant apporté par le porteur de projet? <u>12.585</u> (USD) Quelle est la source de l'apport personnel? (Plusieurs choix possible) ☒ Fonds propres ☐ Dette ☐ Subvention Montant: Montant: USD 12.585 Montant:
Mode d'intervention espérée du Fonds Bleu (besoin pour fiabiliser la faisabilité du projet)	Quel est le mode d'intervention que le porteur de projet espère du Fonds Bleu? (Plusieurs choix possible) <u>Fonds propres</u> ☐ Prise de participation de l'entité du porteur de projet ☐ Prise de participation au niveau des projets <u>Subvention</u> ☒ Subvention <u>Dette</u> ☐ Avances remboursables ☐ Prêt ☐ Garantie d'emprunt

5. ANALYSE DES RISQUES

Risques du projet		
Prière de décrire les risques des projets sur les aspects suivants		
Risques endogènes	Risque opérationnel	- Difficulté d'accès aux sites de mise en œuvre du projet suite aux Mauvais états des routes,
	Risque économique	- Inflation, instabilité des prix sur le marché d'achat des matériels et matières premières, - Faible revenue des populations bénéficiaires du Projet en vue de la rentabilisation du projet.
	Risque juridique	- Conflits fonciers et coutumiers sur les sites de mise en œuvre du Projet, - Le non vulgarisation des textes juridiques en vigueur concernant le code de l'eau en RD Congo,
	Risque financier	- Absence d'institutions financières sur les sites de mise en œuvre du Projet. - Lourdeur fiscale et multiplicité des taxes, - Décaissement lent et tardif du financement par rapport au chronogramme
Risques exogènes	Risque politique	- Conflit politique entre les Acteurs politiques impliqués, - L'instabilité politique ou la difficulté d'impliquer les autorités politico-administratives et coutumières - L'indifférence des autorités politico-administratives, coutumières et la population dans l'appropriation du projet,
	Risque naturel (incendie, inondation, glissement de terrain, érosion)	- les Erosions, les pluies diluviennes, la destruction des voies d'accès, feu de brousse et autres calamités naturelles.
	Autres	- Le financement ne respecte pas le chronogramme des activités. - Discrimination de sexe des personnes vivant avec handicap et celles vivant avec le VIH/SIDA.
